Work Breakdown Structure (WBS)

DigiMenu

Durasi : 6 Bulan

8 April 2026

Daftar Isi

Pendahuluan 3
Struktur Hirarki WBS 3
Level 1 3
Level 2 3
1.1 Project Management 3
2.1 UI/UX Design 3
3.1 Back-End 3
4.1 Front-End 3
5.1 Payment Integration 3
6.1 Testing 4
7.1 Deployment 4
Tabel Level 4

Pendahuluan

Work Breakdown Structure (WBS) adalah alat manajemen proyek yang berfungsi untuk memecah keseluruhan pekerjaan dalam sebuah proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lebih detail, dan lebih mudah dikelola secara hierarkis. Singkatnya, jika sebuah proyek adalah sebuah bangunan besar, WBS adalah "cetak biru" yang menunjukkan setiap batu bata, kabel, dan pipa yang harus dipasang agar bangunan itu berdiri.

Dalam proyek **DigiMenu**, **WBS (Work Breakdown Structure)** adalah pemecahan seluruh pekerjaan pengembangan platform tersebut menjadi komponen-komponen kecil yang lebih teknis dan terukur. Karena proyek ini berfokus pada sistem *self-service*, WBS akan membantu membagi fokus antara pengembangan antarmuka pelanggan, logika *checkout*, hingga integrasi pembayaran.

Struktur Hirarki WBS

Level 1

Penyedia Platform Menu bernama “DigiMenu”

Level 2

1.1 Project Management

1.1.1 Inisialisasi Proyek

1.1.2 Analisis Kebutuhan Proyek

2.1 UI/UX Design

2.1.1 Flowchart Sistem

2.1.2 Protoype Design

3.1 Back-End

3.1.1 Database Schema Design

3.1.2 Database Linking

3.1.3 Pengembangan Fitur

4.1 Front-End

4.1.1 Implementasi Katalog Menu

4.1.2 Cart Management

4.1.3 Order Costumization

5.1 Payment Integration

5.1.1 Payment Gateaway

5.1.2 Calculation Logic

5.1.3 Payment Verification

6.1 Testing

6.1.1 Unit Testing

6.1.2 Integration Testing

6.1.3 User Acceptance Test (UAT)

7.1 Deployment

7.1.1 Instalasi Aplikasi pada Client

7.1.2 Staff Training

7.1.3 Manual Book

Tabel Level

Tabel Level		
Level 1	Level 2	Level 3
Penyedia Platform Menu bernama “DigiMenu”	**1.1 Project Management**	1.1.1 Inisialisasi Proyek 1.1.2 Analisis Kebutuhan Proyek
	2.1 UI/UX Design	2.1.1 Flowchart Sistem 2.1.2 Protoype Design
	3.1 Back-End	3.1.1 Database Schema Design 3.1.2 Database Linking 3.1.3 Pengembangan Fitur
	4.1 Front-End	4.1.1 Implementasi Katalog Menu 4.1.2 Cart Management 4.1.3 Order Costumization
	5.1 Payment Integration	5.1.1 Payment Gateaway 5.1.2 Calculation Logic 5.1.3 Payment Verification
	6.1 Testing	6.1.1 Unit Testing 6.1.2 Integration Testing 6.1.3 User Acceptance Test (UAT)
	7.1 Deployment	7.1.1 Instalasi Aplikasi pada Client 7.1.2 Staff Training 7.1.3 Manual Book

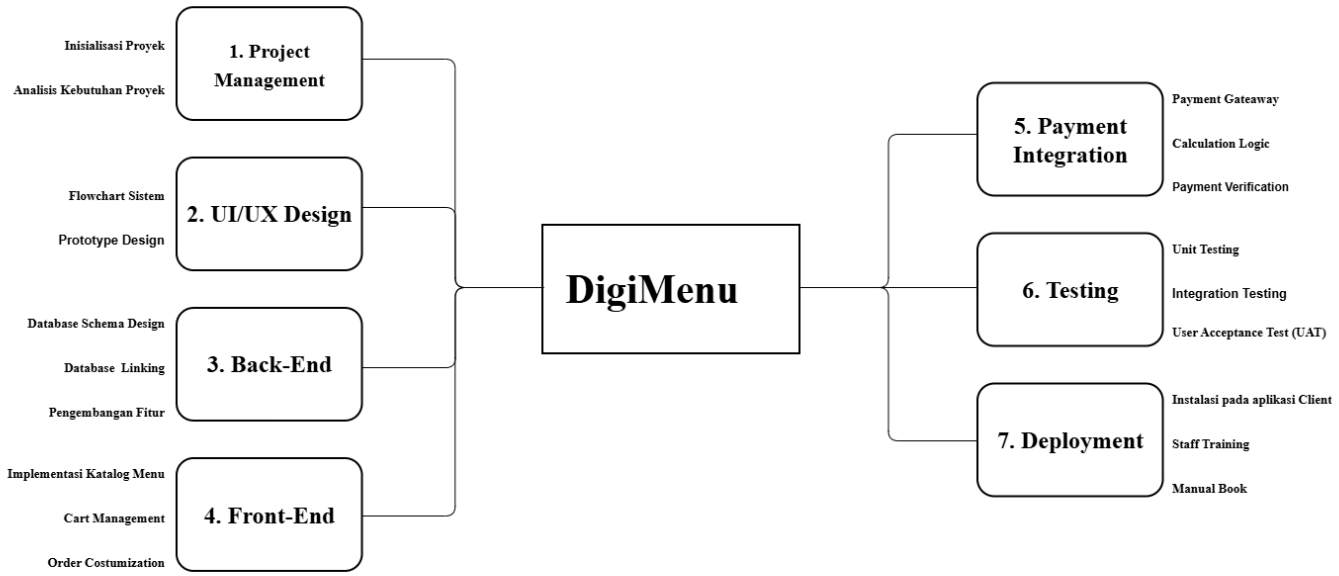
DigiMenu
1. Project Management
Inisialisasi Proyek
Analisis Kebutuhan Proyek
2. UI/UX Design
Flowchart Sistem
Prototype Design
3. Back-End
Database Schema Design
Database Linking
Pengembangan Fitur
4. Front-End
Implementasi Katalog Menu
Cart Management
Order Costumization
5. Payment Integration
Payment Gateaway
Calculation Logic
Payment Verification
6. Testing
Unit Testing
Integration Testing
User Acceptance Test (UAT)
7. Deployment
Instalasi pada aplikasi Client
Staff Training
Manual Book
